



- KHS Modbus TCP/IP Lizenz
- KHS BACnet Gateway



Inbetriebnahme-Checkliste

1/2

Planer

Firma:

Ansprechpartner:

Anschrift:

Tel. / Mobil:

E-Mail:

Betreiber

Firma:

Ansprechpartner:

Anschrift:

Tel. / Mobil:

E-Mail:

Installateur

Firma:

Ansprechpartner:

Anschrift:

Tel. / Mobil:

E-Mail:

MSR

Firma:

Ansprechpartner:

Anschrift:

Tel. / Mobil:

E-Mail:

Objektadresse:

Ansprechpartner vor Ort:

Firma:

Name:


Tel. / Mobil:

E-Mail:

Inbetriebnahme-Checkliste

2/2

Protokoll:

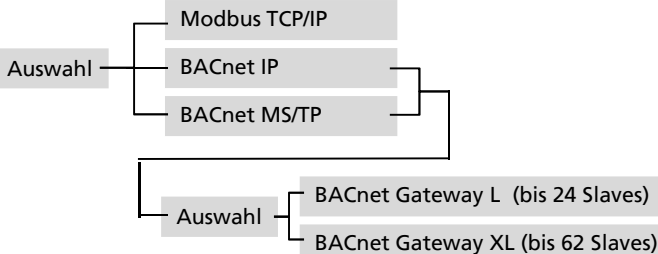

Ja

Nein

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Verkabelung: *(wird nur bei Auswahl des BACnet Gateway benötigt)*

Spannungsversorgung (12-24V AC/DC) an Gateway angeschlossen?

Netzwerkanschluss für Gateway gepatcht?

Anzahl der angeschlossenen Slaves:



Ja

Nein

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Netzwerkeinstellungen Allgemein: *(werkseitige Einstellung)*

IP-Adresse Master 2.0|2.1: *(10.1.23.150)*

IP-Adresse Inbetriebnehmer:

Subnetzmaske: *(255.255.255.0)*

Standard Gateway: *(leer)*



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Netzwerkeinstellungen nach Protokoll: *(voreingestellt)*

Modbus TCP/IP — IP-Adresse GLT (Modbus Client): *(10.1.23.151)*

BACnet IP — IP-Adresse BACnet Gateway (Modbus Client): *(10.1.23.151)*

BACnet MS/TP



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RS-485 Einstellungen: *(wird nur für BACnet MS/TP benötigt)*

MS/TP Adresse:

Baudrate:

Netzwerknummer:



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lizenz:

Seriennummer MASTER 2.0|2.1 (SN vom Typenschild des MASTER 2.0|2.1 wo das Modbus TCP/IP Protokoll freigeschaltet werden soll):

Modbus TCP/IP Lizenzcode

(erfragen unter 02761/891-556 oder lizenz@kemper-olpe.de, Name des Fachgroßhandel oder Rechnung & Seriennummer bereithalten)



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eine Inbetriebnahme ohne vollständig ausgefüllte Checkliste ist leider nicht möglich.

Nicht erbrachte bauseitige Leistungen der Gewerke Sanitär-/Elektrotechnik zum Zeitpunkt des Eintreffens des Kemper-Service-Technikers auf der Baustelle, können zu Mehraufwand, oder im ungünstigen Fall zum Aufschub und Wiederabreise führen. Daraus resultierende Folgekosten sind zusätzlich vom Auftraggeber zu tragen.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)
